



Pt Nawasena Media Dayatama

18 Office Park Building TB Simatupang, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12520

+62 822-4632-2907 / +62 851-2435-7712

nawasenamediatayutama@gmail.com

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN VIDEOTRON

Nomor : SL/001/VI/2026
Tanggal : Selasa/09/Juni/2026
Lampiran : Dokumentasi/Foto Progres
Perihal : Laporan Kemajuan Pekerjaan Videotron

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pengadaan

Bpk. Ubay Setyo Nugroho

NIP : 199606182018011001

di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Videotron berdasarkan Surat Pesanan Nomor EP-01KS4X7VY4JW15X1QA2WZV00VB tanggal 29 Mei 2026, bersama ini kami menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 09 Juni 2026.

A. DATA PEKERJAAN

Nama Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Videotron
Nomor Surat Pesanan	EP-01KS4X7VY4JW15X1QA2WZV00VB
Nilai Kontrak	Rp 3.432.564.000
Jangka Waktu	60 hari kalender
Lokasi Pekerjaan	Gedung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Nama Penyedia	PT Nawasena Media Dayatama
Periode Laporan	s.d. 9 Juni 2026

B. PROGRES PEKERJAAN

No.	Uraian Pekerjaan	Realisasi	Bobot	Progres	Keterangan
1	Persiapan dan koordinasi teknis	100%	-	0	Selesai dilaksanakan koordinasi dengan ppk dan tim pengelola medai
2	Pengadaan unit videotron dan perangkat pendukung	100%	50	50%	Pengadaan Barang sudah lengkap secara keseluruhan mencapai 144 unit
3	Pengiriman barang ke lokasi pekerjaan	30%	10	0%	Perlengkapan Untuk Pemasangan Sebagian sudah dikirimkan ke Gedung Kemenko Infra
4	Pemasangan rangka/struktur	30%	20	6%	Kerangka struktur sudah selesai design dan tahap pembuatan rangka
5	Instalasi panel LED, kelistrikan, dan control system	30%	20	6%	Sudah melakukan pemetaan terhadap Pekerjaan Listrik, instalasi, dan Control system
6	Pengujian fungsi/commissioning	30%	-		Sudah dilakukan uji fungsi Modul
Total Progres Pekerjaan dengan laporan ini sebesar				62%	

C. URAIAN SINGKAT PEKERJAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

1. Telah dilakukan koordinasi dengan pihak PPK terkait jadwal, lokasi, dan teknis pemasangan;
2. Penyedia telah melakukan survey Lokasi pemasangan Videotron, rencana penempatan control system, dan kelistrikan;
3. Penyedia telah melakukan pengadaan/persiapan barang sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak/SPK;
4. Penyedia melakukan ujicoba fungsi setiap modul;
5. Penyedia telah melakukan design rangka/struktur dan membuat kerangka untuk siap dipasangkan di sisi Gedung;
6. Dokumentasi progres pekerjaan dilampirkan dalam laporan ini.

D. KENDALA

1. Penyesuaian kondisi lapangan pada titik pemasangan;
2. Koordinasi sumber listrik, jalur kabel, dan akses area kerja;
3. Penyesuaian jadwal kerja agar tidak mengganggu aktivitas di Lokasi;
4. Kondisi Gondola yang tidak bias dioperasikan.

E. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Menyelesaikan pemasangan rangka/struktur dan panel LED;
2. Melanjutkan instalasi kelistrikan, kabel data, dan control system;
3. Melakukan konfigurasi sistem, uji fungsi, dan commissioning;
4. Menyiapkan pelatihan operator serta dokumen serah terima pekerjaan;
5. Membawa mesin motor atau langsung dengan membawa Gondola portable sendiri

F. PENUTUP

Demikian laporan kemajuan pekerjaan ini kami sampaikan. Kami berkomitmen menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, baik dari sisi waktu, mutu, maupun kelengkapan administrasi.

Jakarta, 09 Juni 2026

Penyedia,



The logo consists of the letters 'nmd' in a stylized, blue, lowercase font. Below the letters, the full name 'NAWASENA MEDIA DAYATAMA' is written in a smaller, blue, uppercase font. A handwritten signature in black ink is written across the logo.

Muhammad Prasetyo Argoseno
Direktur Utama
PT Nawasena Media Dayatama



Pt Nawasena Media Dayatama

18 Office Park Building TB Simatupang, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12520

+62 822-4632-2907 / +62 851-2435-7712

nawasenamediatayutama@gmail.com

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN VIDEOTRON

Nomor : SL/002/VII/2026
Tanggal : Jumat/17/Juli/2026
Lampiran : Dokumentasi/Foto Progres
Perihal : Laporan Kemajuan Pekerjaan Videotron

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pengadaan

Bpk. Ubay Setyo Nugroho

NIP : 199606182018011001

di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Videotron berdasarkan Surat Pesanan Nomor **EP-01KS4X7VY4JW15X1QA2WZV00VB** tanggal 29 Mei 2026, bersama ini kami menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 17 Juli 2026.

A. DATA PEKERJAAN

Nama Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Videotron
Nomor Surat Pesanan	EP-01KS4X7VY4JW15X1QA2WZV00VB
Nilai Kontrak	Rp 3.432.564.000
Jangka Waktu	60 hari kalender
Lokasi Pekerjaan	Gedung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Nama Penyedia	PT Nawasena Media Dayatama
Periode Laporan	s.d. 17 Juli 2026

B. PROGRES PEKERJAAN

No.	Uraian Pekerjaan	Realisasi	Bobot	Progres	Keterangan
1	Persiapan dan koordinasi teknis	100%	-	0	Selesai dilaksanakan koordinasi dengan ppk dan tim pengelola medai
2	Pengadaan unit videotron dan perangkat pendukung	100%	50	50%	Pengadaan Barang sudah lengkap secara keseluruhan mencapai 144 unit
3	Pengiriman barang ke lokasi pekerjaan	100%	10	10%	Perlengkapan Untuk Pemasangan Seluruhnya sudah dikirimkan ke Gedung Kemenko Infra
4	Pemasangan rangka/struktur	100%	20	20%	Kerangka struktur sudah terinstalasi
5	Instalasi panel LED, kelistrikan, dan control system	40%	20	8%	Sudah melakukan pemetaan terhadap Pekerjaan Listrik, instalasi, dan Control system
6	Pengujian fungsi/commissioning	30%	-		Sudah dilakukan uji fungsi Modul
Total Progres Pekerjaan dengan laporan ini sebesar				88%	

C. URAIAN SINGKAT PEKERJAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

1. Telah dilakukan koordinasi dengan pihak PPK terkait jadwal, lokasi, dan teknis pemasangan;
2. Penyedia telah melakukan survey Lokasi pemasangan Videotron, rencana penempatan control system, dan kelistrikan;
3. Penyedia telah melakukan pengadaan/persiapan barang sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak/SPK;
4. Penyedia melakukan ujicoba fungsi setiap modul;
5. Penyedia telah menginstalasi keseluruhan rangka dan 40% cabinet sudah terpasang
6. Dokumentasi progres pekerjaan dilampirkan dalam laporan ini.

D. KENDALA

1. Penyesuaian kondisi lapangan pada titik pemasangan;

2. Koordinasi sumber listrik, jalur kabel, dan akses area kerja;
3. Penyesuaian jadwal kerja agar tidak mengganggu aktivitas di Lokasi;
4. Kondisi Gondola yang tidak bias dioperasikan.

E. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Menyelesaikan pemasangan panel LED;
2. Melanjutkan instalasi kelistrikan, kabel data, dan control system;
3. Melakukan konfigurasi sistem, uji fungsi, dan commissioning;
4. Menyiapkan pelatihan operator serta dokumen serah terima pekerjaan;

F. PENUTUP

Demikian laporan kemajuan pekerjaan ini kami sampaikan. Kami berkomitmen menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, baik dari sisi waktu, mutu, maupun kelengkapan administrasi.

Jakarta, 17 Juli 2026

Penyedia,



The logo consists of the letters 'nmd' in a stylized, blue, lowercase font. Below the letters, the text 'NAWASENA MEDIA DAYATAMA' is written in a smaller, blue, uppercase font. A handwritten signature in black ink is written over the logo.

Muhammad Prasetyo Argoseno
Direktur Utama
PT Nawasena Media Dayatama


Dokumentasi progres pekerjaan Videotron



Proses instalasi rangka videotron



Progres rangka 100% terpasang

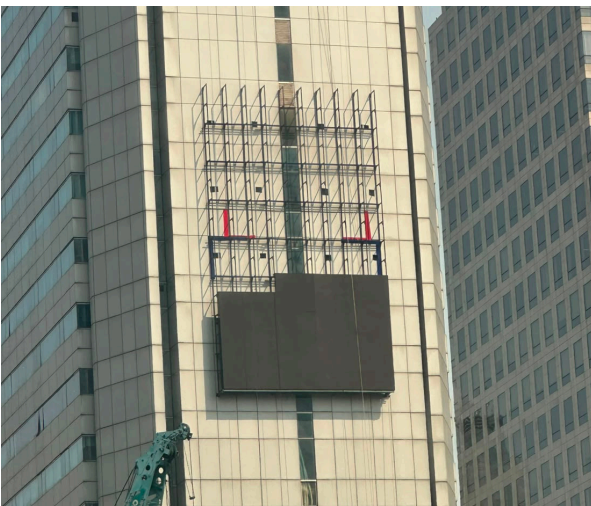

Progres kabinet 40% terpasang



Pt Nawasena Media Dayatama

18 Office Park Building TB Simatupang, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12520

+62 822-4632-2907 / +62 851-2435-7712 nawasenamediadayatama@gmail.com

**LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
PENGADAAN DAN PEMASANGAN VIDEOTRON**

Nomor : SL/003/VIII/2026
Tanggal : Rabu/29/Juli/2026
Lampiran : Dokumentasi/Foto Progres
Perihal : Laporan Kemajuan Pekerjaan Videotron

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pengadaan

Bpk. Ubay Setyo Nugroho NIP

: 199606182018011001 di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Videotron berdasarkan Surat Pesanan Nomor **EP-01KS4X7VY4JW15X1QA2WZV00VB** tanggal 29 Mei 2026, bersama ini kami menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 29 Juli 2026. **A. DATA PEKERJAAN**

Nama Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Videotron
Nomor Surat Pesanan	EP-01KS4X7VY4JW15X1QA2WZV00VB
Nilai Kontrak	Rp 3.432.564.000
Jangka Waktu	60 hari kalender
Lokasi Pekerjaan	Gedung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Nama Penyedia	PT Nawasena Media Dayatama
Periode Laporan	s.d. 29 Juli 2026

B. PROGRES PEKERJAAN

No.	Uraian Pekerjaan	Realisasi	Bobot	Progres	Keterangan
1	Persiapan dan koordinasi teknis	100%	-	0	Selesai dilaksanakan koordinasi dengan ppk dan tim pengelola medai
2	Pengadaan unit videotron dan perangkat pendukung	100%	50	50%	Pengadaan Barang sudah lengkap secara keseluruhan mencapai 144 unit
3	Pengiriman barang ke lokasi pekerjaan	100%	10	10%	Perlengkapan Untuk Pemasangan Seluruhnya sudah dikirimkan ke Gedung Kemenko Infra
4	Pemasangan rangka/struktur	100%	20	20%	Kerangka struktur sudah terinstalasi
5	Instalasi panel LED, kelistrikan, dan control system	100%	20	20%	Panel LED , kelistrikan dan control system seluruhnya sudah terinstall
6	Pengujian fungsi/commissioning	100%	-	0	Sudah dilakukan uji fungsi Modul
Total Progres Pekerjaan dengan laporan ini sebesar				100%	

C. URAIAN SINGKAT PEKERJAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

1. Penyedia telah menginstalasi seluruh Panel,Kabinet,Rangka dan Module videotron secara keseluruhan
2. Penyedia Telah Melakukan Training terhadap tim DKIP
3. Penyedia melakukan ujicoba fungsi setiap modul;
4. Penyedia telah menginstalasi keseluruhan rangka dan 100% cabinet sudah terpasang
5. Dokumentasi progres pekerjaan dilampirkan dalam laporan ini.

F. PENUTUP

Demikian laporan penyelesaian pekerjaan ini kami sampaikan. Kami berkomitmen menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, baik dari sisi waktu, mutu, maupun kelengkapan administrasi.

Jakarta, 29 Juli 2026
Penyedia,



NAWASENA MEDIA DAYATAMA

Muhammad Prasetyo Argoseno
Direktur Utama
PT Nawasena Media Dayatama

GUIDE CONTROL MEDIA PLAYER VIDEOTRON

A. CONTROL MEDIA PLAYER (RUANGAN SERVER LT 6)


1. PASTIKAN CONTROLER MEDIA PLAYER SUDAH HIDUP DENGAN MENGIKUTI TAHAP BERIKUT :

	
<p>Controler media player beserta Kabel Power,Kabel HDMI,Kabel Lan Control Setting</p>	<p>Koneksikan jaringan kabel LAN ke port LAN media player sesuai no urut pada port LAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> -LAN 1 koneksikan pada port LAN 1 -LAN 2 koneksikan pada port LAN 2 -LAN 3 koneksikan pada port LAN 3 -LAN 4 koneksikan pada port LAN 4


			
<p>Kabel power koneksikan pada port power</p>	<p>Kabel lan control di koneksikan untuk mengcontrol settingan dan upload konten pada media media player</p>	<p>Kabel HDMI di koneksikan jika ingin menampilkan secara live pada laptop/mini PC</p>	<p>Kabel LAN data koneksikan pada port LAN sesuai no urut yang sudah di beri lebel 1 s/d 4 berfungsi sebagai sending data dari media player ke layar videotron</p>

Pastikan semua terkoneksi pada port masing masing

2. UNTUK MENGUPLOAD VIDEO/GAMBAR PADA MEDIA PLAYER KONEKSIKAN JARINGAN WIFI /SSID KE ALAT MEDIA PLAYER USERNAME WIFI (A6L-25-A13A3) PASSWORD WIFI (88888888) (JIKA SSID DI OF KAN MAKA KONEKSI KE MEDIA PLAYER MENGGUNAKAN KABEL LAN CONTROL)




3. DOWNLOAD TERLEBIH DAHULU APLIKASI HDPLAYER UNTUK CONTROL MEDIA PLAYER PADA PERANGKAT KOMPUTER (https://www.hdwell.com/Download/index_100000010736467.html)
4. JIKA SUDAH TERDOWNLOAD SILAHKAN DI INSTAL TERLEBIH DAHULU APLIKASI NYA SELANJUTNYA BUKA APLIKASI HDPLAYER MAKA AKAN MUNCUL TAMPILAN LAYAR SEPERTI BERIKUT SELANJUTNYA IKUTI TAHAP BERIKUT :
 - a. pastikan “gunakan pengaturan hardware” ter ceklist
 - b. pastikan ukuran layar yang muncul 1080 x 1920 (sudah otomatis terbaca oleh system ukuran layar nya)
 - c. pastikan logo indikasi online pada alat tersebut muncul (logo hijau pada kotak) jika tidak ada logo online pastikan koneksi ke media player terhubung jika disconnect hubungkan kembali wifi nya jika sudah online kembali, klik menentukan

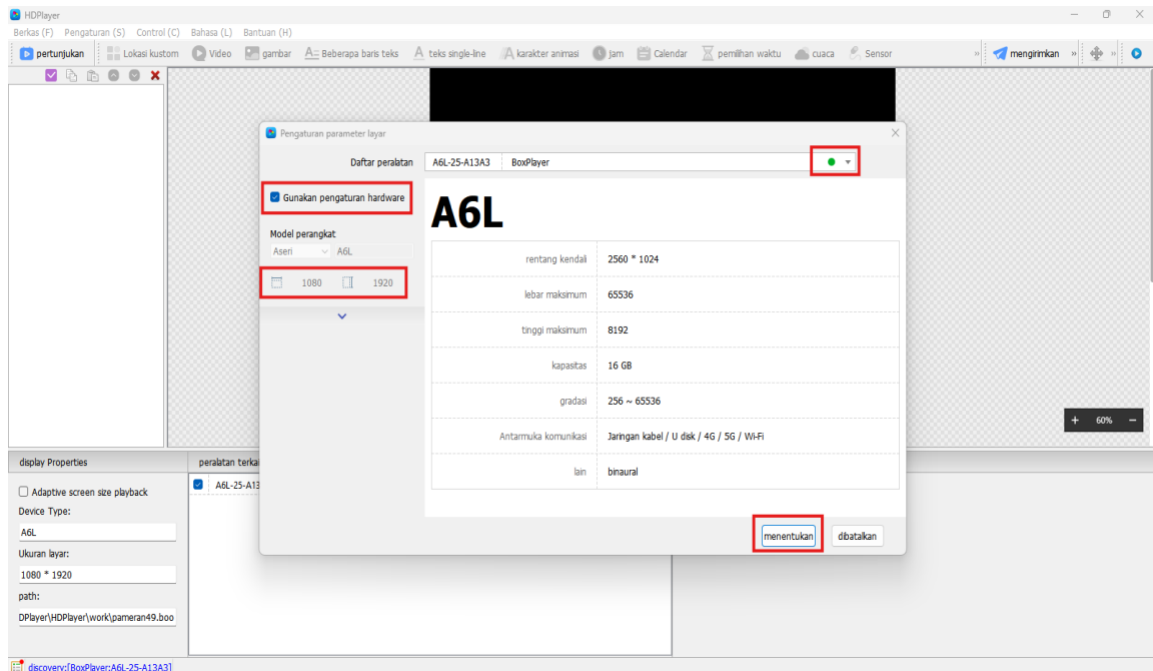

5. SELANJUTNYA PADA LAYAR AKAN MENAMPILKAN GAMBAR BERIKUT :

a. TAHAP UPLOAD VIDEO :


1. Klik icon **pertunjukan** 1 kali untuk memilih program video.
2. Selanjutnya klik icon **video** untuk menampilkan program video.
3. Selanjutnya klik icon **program video** untuk tahap upload video.
4. Selanjutnya klik icon (+) maka akan muncul tampilan pilihan video yang ingin di tayangkan dan pilih video yang akan diupload lalu klik open.
5. Selanjutnya jika video sudah di pilih maka klik icon **mengirimkan** dan tunggu beberapa saat sampai video selesai ter upload untuk video akan otomatis tayang pada layar di Videotron.
6. Jika ada lebih dari 1 video yang ingin di tampilkan maka tampilan pada layar Videotron akan menampilkan secara berkelanjutan, sesuai urutan video yang di upload (Untuk mengatur urutan video yang akan di tampilkan setelah di upload file video akan muncul di dashboard perangkat dan selanjutnya klik tahan pada mouse lalu tarik video sesuai urutan yang di inginkan).

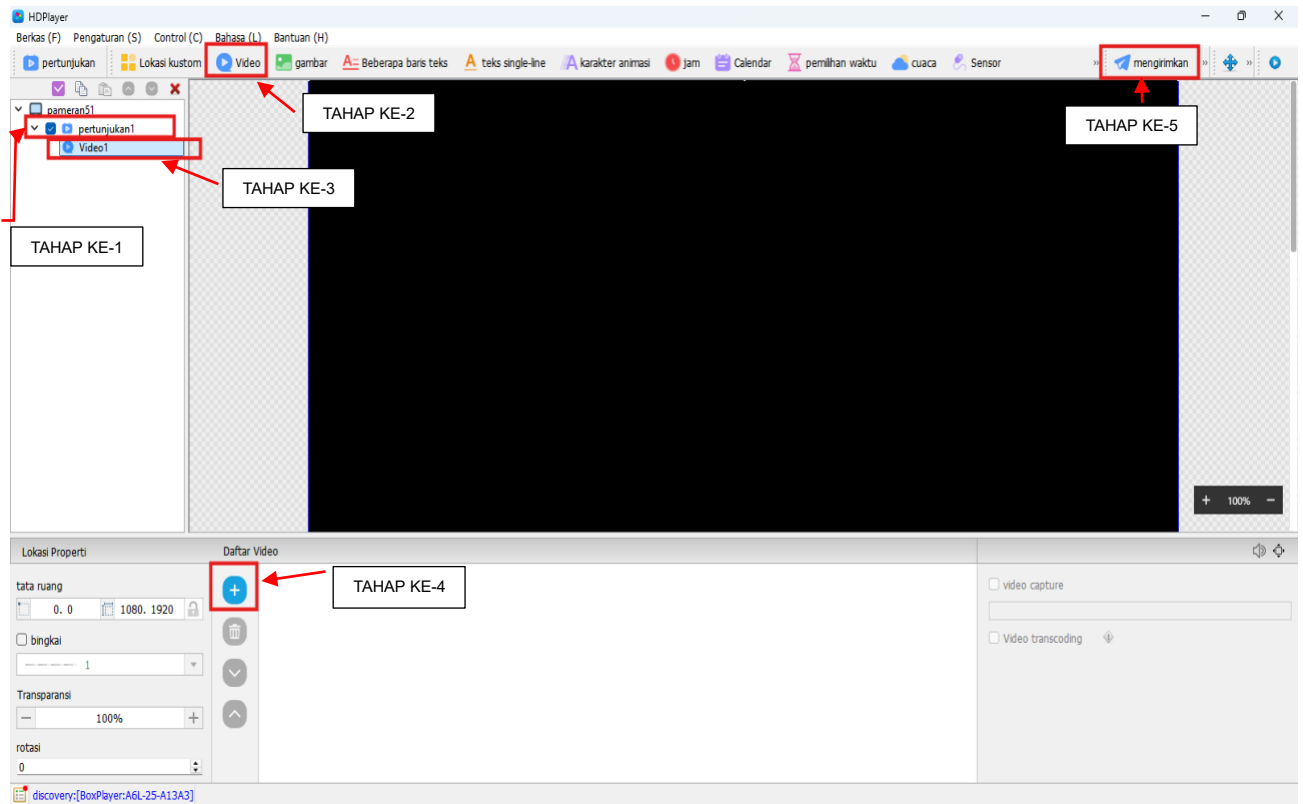

b. TAHAP UPLOAD FOTO/GAMBAR

1. Klik icon **pertunjukan** 1 kali untuk memilih program gambar.
2. Selanjutnya klik icon **gambar** untuk menampilkan program gambar.
3. Selanjutnya klik icon program **gambar** untuk tahap upload gambar/foto.
4. Selanjutnya klik icon (+) maka akan muncul tampilan pilihan gambar/foto yang ingin di tayangkan dan pilih gambar/foto yang akan diupload lalu klik open.
5. Selanjutnya jika gambar/foto sudah di pilih maka klik icon mengirimkan dan tunggu beberapa saat sampai gambar/foto selesai ter- upload, untuk gambar/foto akan otomatis tayang pada layar di Videotron.


6. Untuk gambar/foto bisa di atur animasi nya dan durasi tayangnya sesuai ke inginan dengan cara memilih settingan pada dashboard pojok kanan bawah : **pameran** (untuk tipe slide gambar/foto), pada **hapus layer** (untuk tipe pergantian gambar/foto lebih jelas atau berbayang), pada **tinggal** (untuk durasi waktu tayang gambar/foto di layer Videotron)

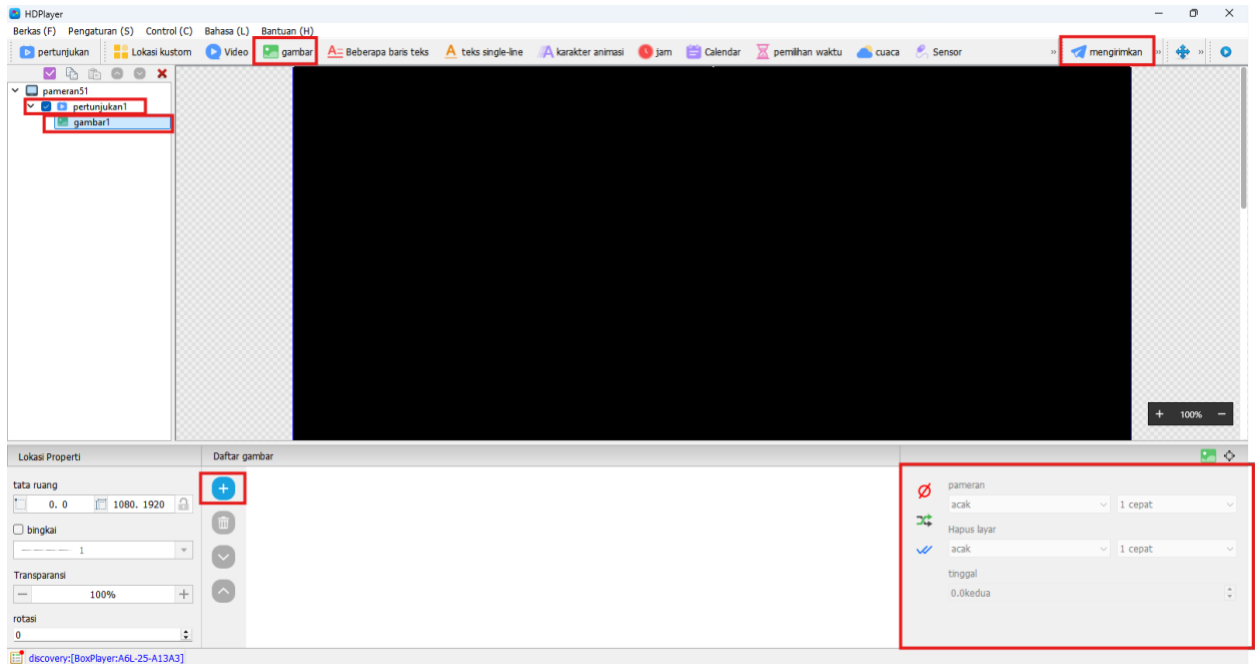


C. TAHAP UPLOAD VIDEO & GAMBAR/FOTO BERGANTIAN :

1. Buat terlebih dahulu 2 program pertunjukan dengan cara klik icon **pertunjukan** 2 kali (pertunjukan 1 untuk video, pertunjukan 2 untuk gambar), agar saat menampilkan video dan gambar pada layar videotron tidak tumpang tindih.
2. Untuk mengupload video klik terlebih dahulu pertunjukan 1 lalu klik icon **video**, untuk meng upload video


3. Untuk mengupload gambar/foto klik terlebih dahulu pertunjukan 2 lalu klik icon **gambar**, untuk mengupload gambar/foto
4. Jika sudah ter upload video dan gambar/foto nya selanjutnya klik icon **pameran** terlebih dahulu lalu klik icon **mengirimkan** tunggu beberapa saat video dan gambar/foto nya akan tayang secara bergantian di layar Videotron

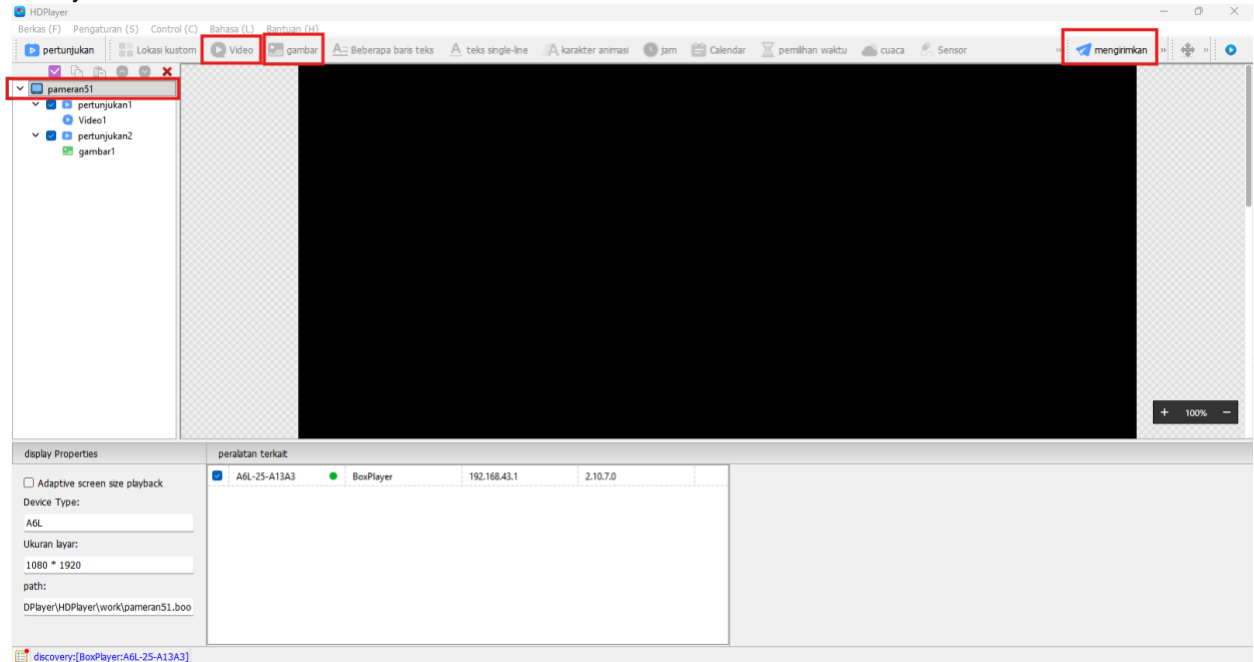

- d. PENGATURAN TAMBAHAN & TROUBLESHOOT MEDIA PLAYER
 1. INFORMASI TAMBAHAN PERANGKAT MEDIA PLAYER

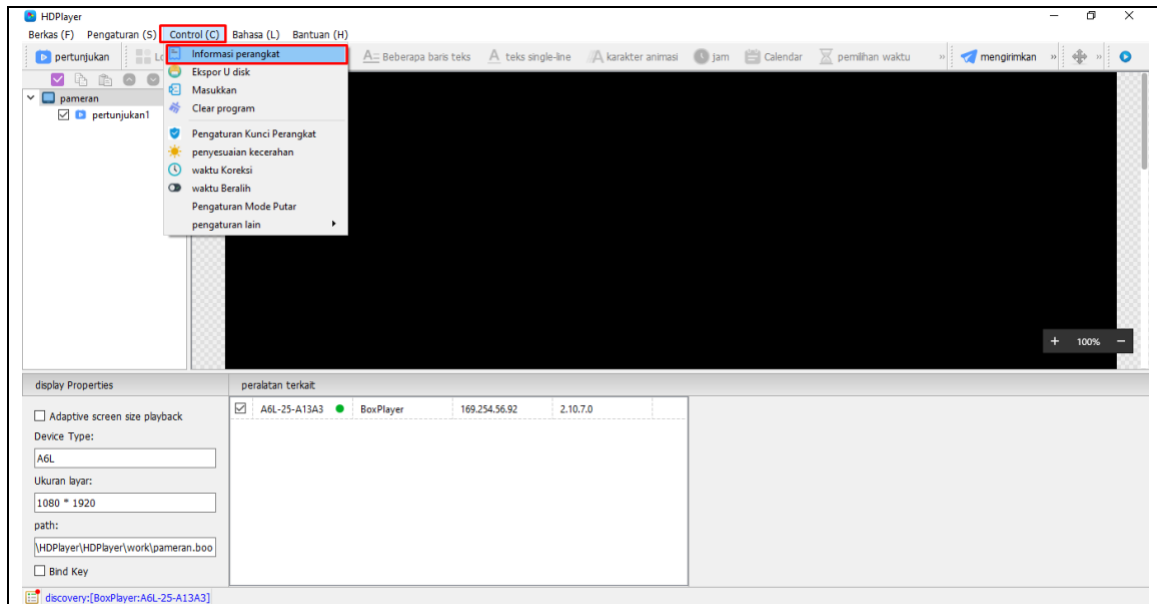

-Untuk mengakses informasi dan setting pada perangkat media player bisa di akses dengan cara klik 1 kali pada icon **Control (C)** lalu klik 1 kali pada icon **Informasi Perangkat**

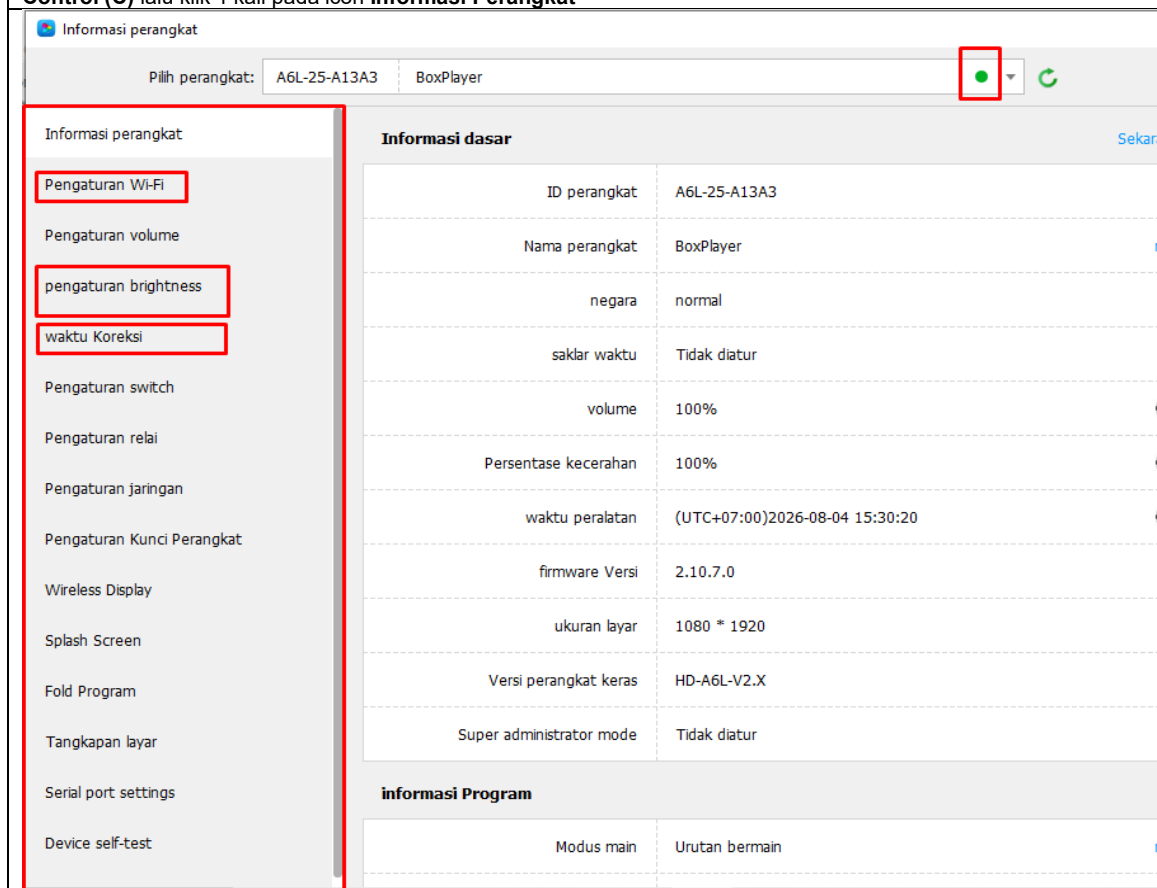


-Tampilan dashboard setting pada media player pada umum nya setting tambahan media player yang bisa di gunakan hanya untuk mengatur jaringan akses WIFI & mengatur BRIGHTNESS

GUIDE CONTROL PANEL LISTRIK VIDEOTRON

A. ON & OF PANEL DAYA LISTRIK VIDEOTRON (AREA CONTROL DI TANGGA DARURAT LT 12)

1. TAHAPAN PENGATURAN TIMER & MANUAL PADA PANEL LISTRIK

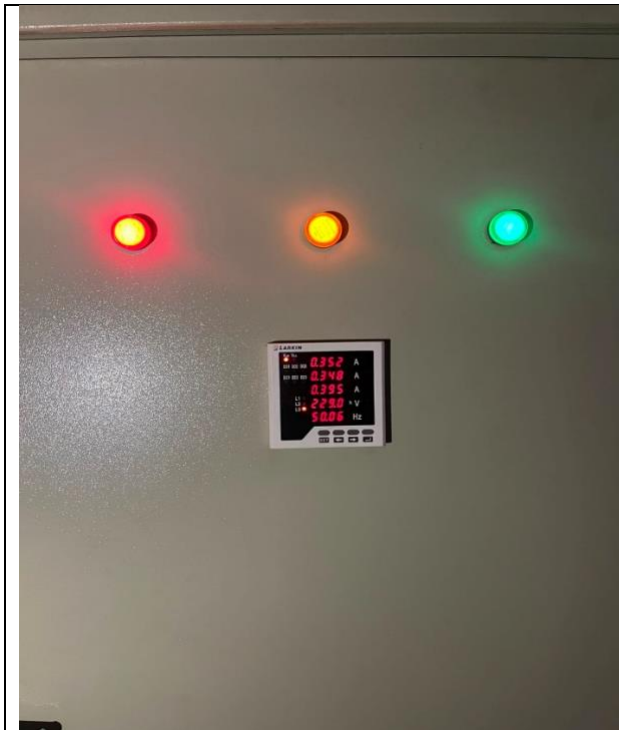

- Tampak depan area panel Listrik Videotron dengan layar digital panel



-Tampak dalam area panel Listrik Videotron total 37 mcb Listrik dan 1 sakelar timer digital yang di gunakan sebagai control power Videotron dan Exhoustfan (37 mcb 25 A)



- Kontrol panel Listrik Videotron menggunakan sakelar timer digital (ON-OFF-AUTOMATIC)
 - Tombol P berfungsi sebagai program set timer yang ingin di atur terdapat beberapa program yang bisa di pilih dan di setting sesuai kebutuhan user jika ingin menjadwalkan waktu ON dan OF panel listrik
 - Tombol D+ berfungsi untuk setting tanggal pada timer
 - Tombol H+ berfungsi untuk setting jam pada timer
 - Tombol M+ berfungsi untuk setting menit pada timer
 - Tombol logo Timer berfungsi untuk mengecek dan setting program jadwal On & Of pada panel listrik
 - Tombol Reset berfungsi untuk mereset secara keseluruhan program yang sudah di setting pada timer
 - Tombol Manual berfungsi sebagai tombol utama pada panel Listrik di mana terdapat pilihan yang akses dengan cara mengklik tombol manual (klik 1 kali setting On 24 jam pada panel listrik, klik satu kali Kembali untuk - mengaktifkan timer otomatis yang sudah di program, klik 1 kali Kembali untuk mematikan panel Listrik secara manual)
- NOTED : Sebelum mengatur program timer pada sakelar timer sinkronkan terlebih dahulu waktu "hari-jam-menit" pada layar indikator sakelar timer, sesuai dengan hari-jam-menit yang sedang berjalan.



-tampilan program yang sudah tersetting sementara hari-jam-menit (jadwal yang sudah ter setting panel Listrik akan menyala setiap hari senin s/d sabtu di jam 6 pagi)



-tampilan program yang sudah tersetting sementara hari-jam-menit (jadwal yang sudah ter setting di panel Listrik akan mati setiap hari senin s/d sabtu di jam 23:56 malam) total waktu oprasi Videotron 18 jam nonstop di setiap hari nya

B. TROUBLESHOOT PANEL LISTRIK

1. Cara mengatasi masalah saat menyalakan panel Listrik videotron secara manual dan otomatis



-tampilan layar Videotron saat baru di hidupkan secara manual/otomatis, terdapat garis hitam, jika terjadi seperti ini cek kembali panel Listrik jika ada mcb yang turun, naikan secara manual dan cek kembali layar videotron nya.




-Tampak dalam panel Listrik jika layar videotron ada led kabinet yang mati, cek terlebih dahulu salah satu MCB nya jika ada yang turun naikan kembali sakelar nya secara manual, sakelar MCB turun di akibatkan tarikan awal Listrik yang cukup besar sehingga MCB otomatis akan turun.

2. Cara mengatasi masalah saat mematikan panel Listrik secara manual dan otomatis



-tampilan layar Videotron saat baru di matikan secara manual/otomatis,terdapat garis Cahaya tertanda ada jalur sakelar mcb yang masih menyala (kerusakan pada kontaktor), jika terjadi seperti ini cek kembali panel Listrik nya dan matikan semua mcb di panel dengan cara menurunkan semua sakelar mcb control (37mcb)

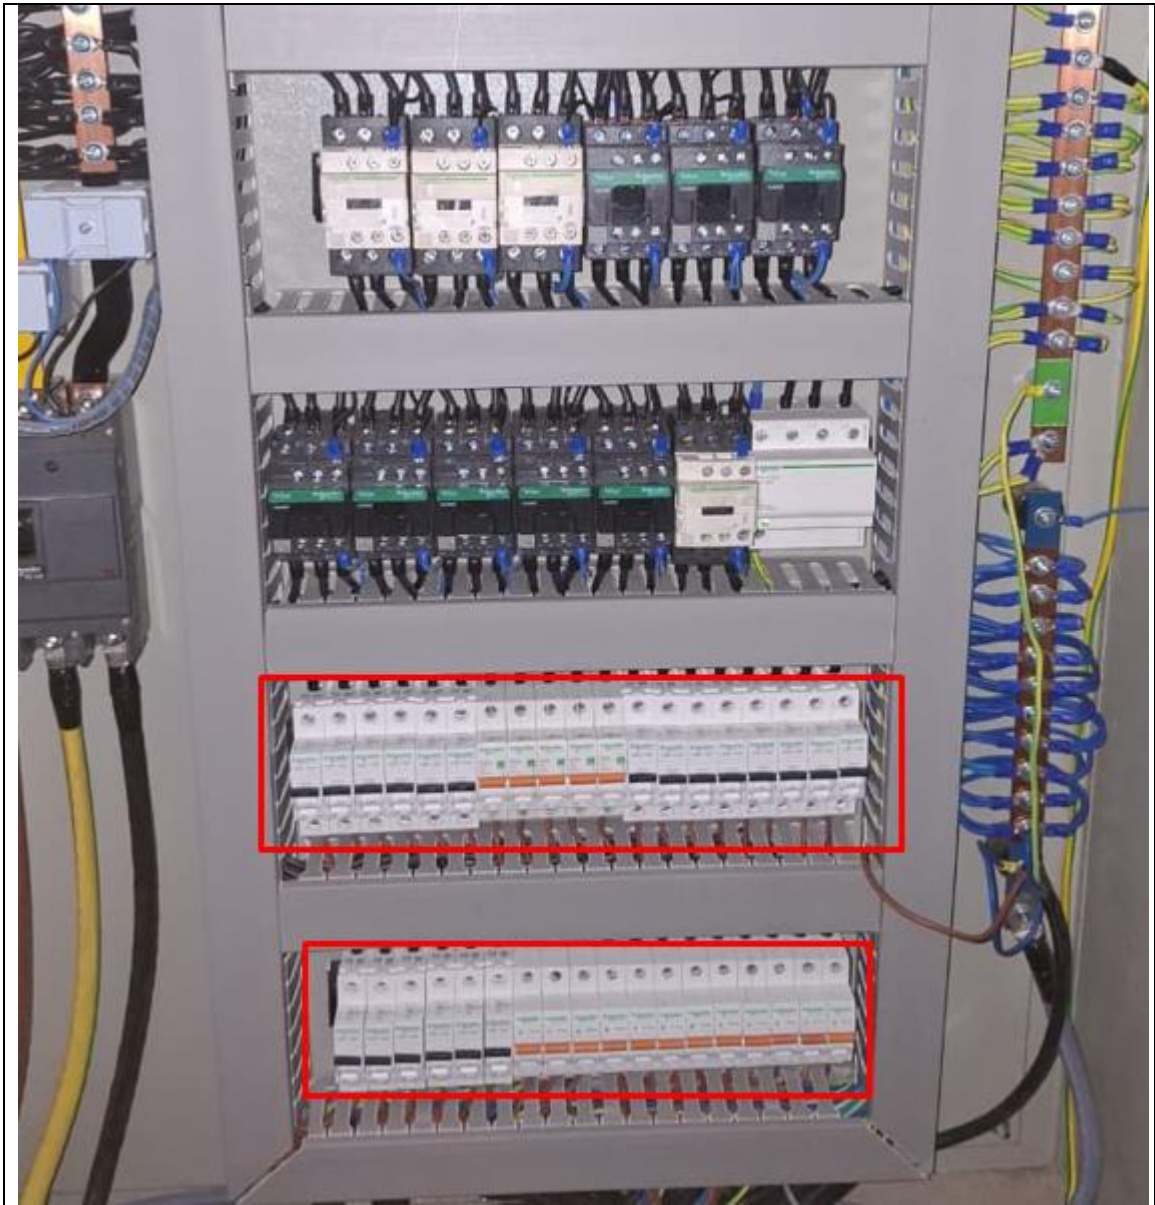


-Tampak dalam panel Listrik jika layar videotron sudah mati akan tetapi masih ada layar videotron yang menyala tahap awal untuk mematikan videotron nya dengan cara menurunkan semua sakelar MCB secara manual (dari hasil pengecekan kami sebelum nya kontaktor nya tidak berfungsi secara maksimal sehingga Solusi perbaikan nya dengan cara mengganti kontaktaktor yang sudah terpasang dengan kontaktor baru)


TOTAL BEBAN VIDEOTRON





-berat 1 kabinet (led videotron yang sudah di rakit) -+ 25 s/d 26 kg total terdapat 144 kabinet


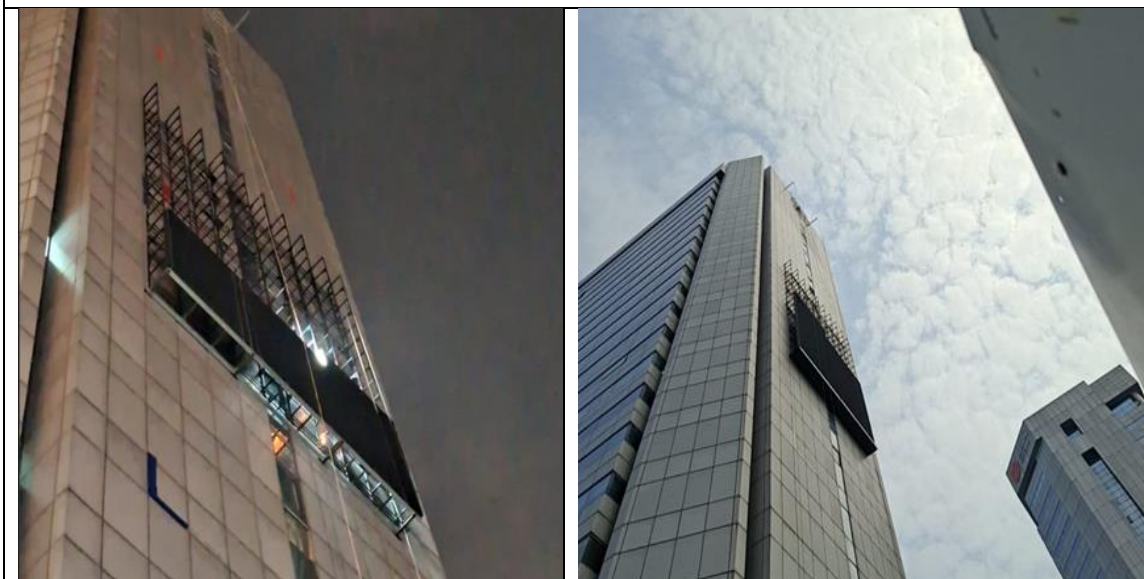


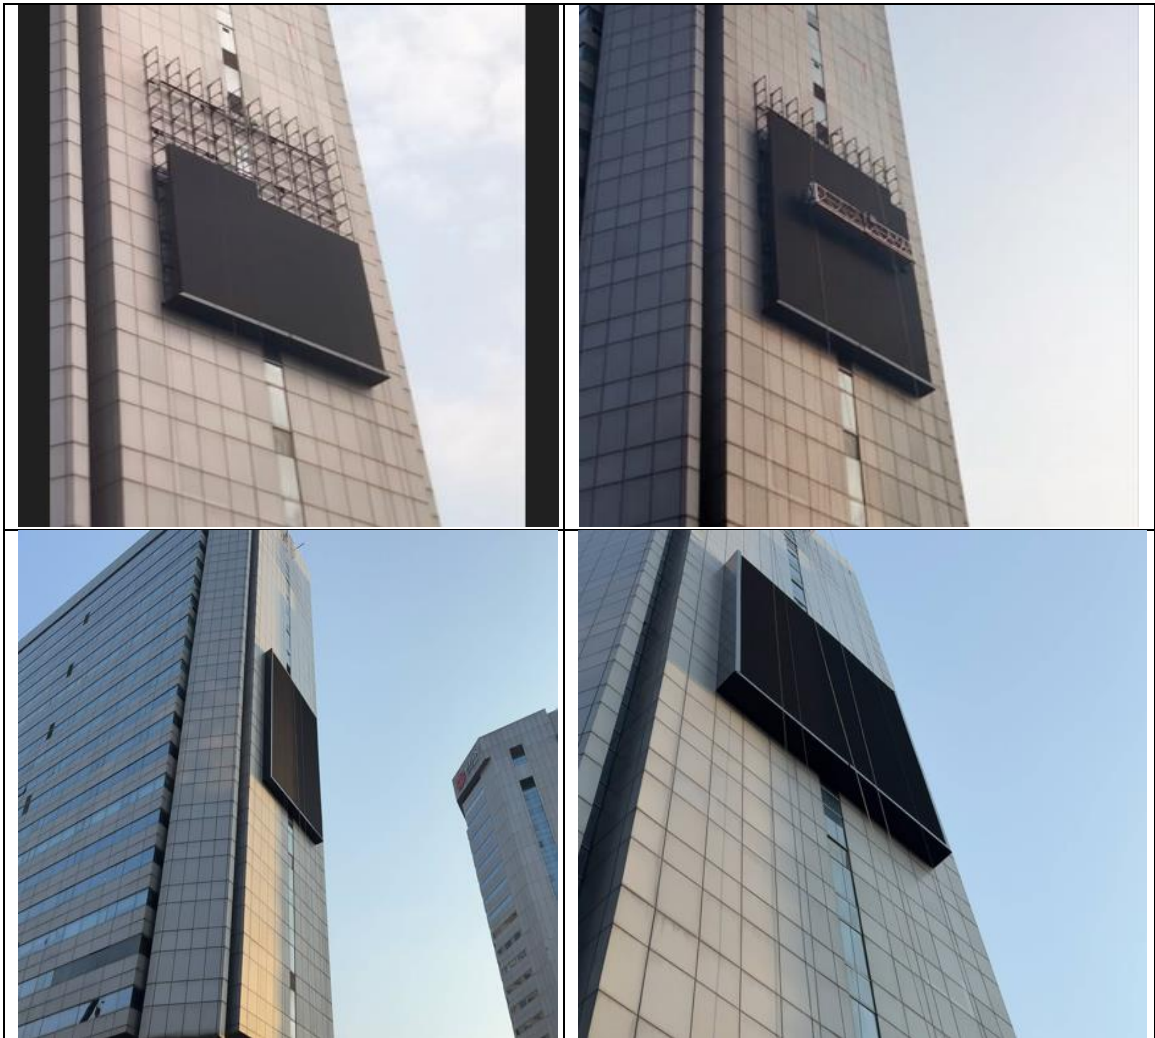

-Total beban keseluruhan pada videotron -+ 4.744 kg :
-struktur rangka 900 kg
-kabinet led videotron 26 kg x 144 = 3.744 kg
-acp dan exhaustfan 100 kg

Dokumentasi progres pekerjaan Videotron

- Videotron sudah terinstall dan menyala

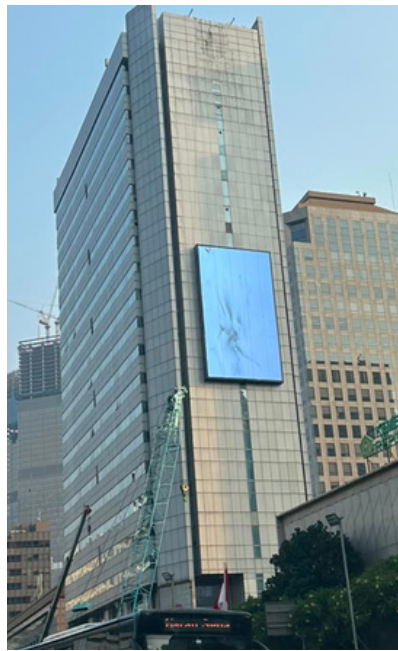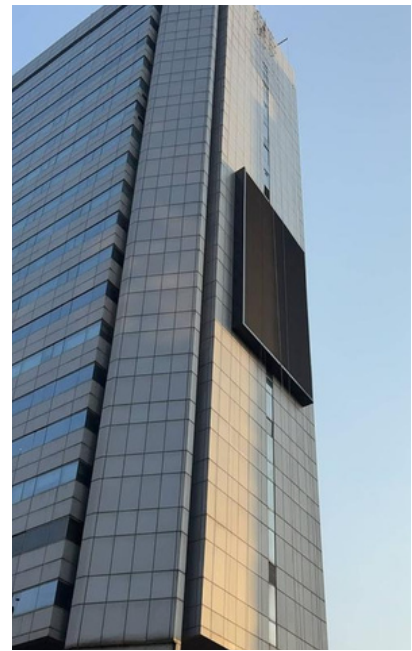

- Training dari tim videotron terhadap tim DKIP terkait pengoperasian Videotron

